Assinado por: César Augusto Pereira Da Silva Jordão
Certificado Digital Qualificado Individual | Documento Assinado Eletronicamente | Esta assinatura eletrónica qualifica a assinatura manuscrita na UE

JUNTA DE FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

PLANO DE TRABALHOS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE S. MIGUEL, RUA DA ALMOINHA E RUA DO COVÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO - 90 DIAS

ID	Nome da Tarefa	Duração
1	**2026-017 - Pavimentação da Rua de S. Miguel, Rua da Almoinha e Rua dc**	**90 dias**
2	**1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO MIGUEL**	**30 dias**
3	Estaleiro	30 dias
4	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transpo	6 dias
5	1.2 - Escavação em abertura de caixa dos arruamentos incluindo ala	8 dias
6	1.3 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regulari	5 dias
7	1.4 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de cola	7 dias
8	1.5 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma	7 dias
9	1.6 - Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa ir	4 dias
10	**1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ALMOINHA**	**30 dias**
11	Estaleiro	30 dias
12	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transpo	5 dias
13	1.2 - Alargamento da plataforma incluindo execução de demolição in	3 dias
14	1.3 - Execução de demolição integral de muro em tijolo com 5m de a	3 dias
15	1.4 - Escavação em abertura de caixa dos arruamentos incluindo ala	6 dias
16	1.5 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regulari	7 dias
17	1.6 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de cola	6 dias
18	1.7 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma	6 dias
19	**1 - RUA DO COVÃO - CHÃS**	**30 dias**
20	Estaleiro	30 dias
21	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transpo	5 dias
22	1.2 - Limpeza e ieperfilamento das valetas e bermas criando pendent	5 dias
23	1.3 - Desmatação e decapagem de taludes com meios manuais oum	6 dias
24	1.4 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regulari	6 dias
25	1.6 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de cola	8 dias
26	1.7 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma	8 dias

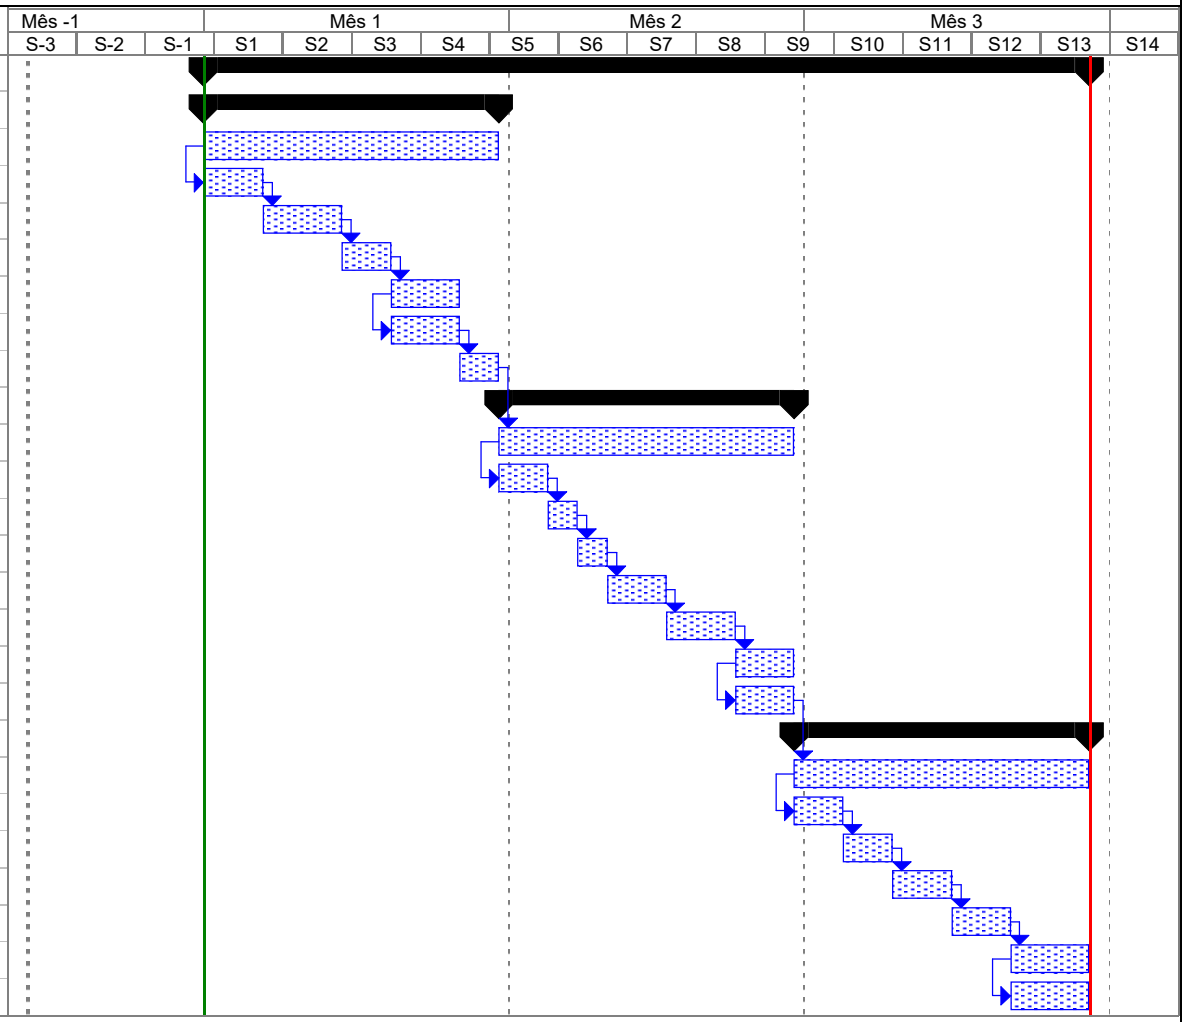

Projecto: Pavimentação da Rua de S. M
Data: 14/07/26

Tarefa		Marco		Tarefas Externas	
Dividir		Sumário		Marco Externo	
Progresso		Resumo de Projecto		Prazo	
